




코일 라싱 해체 작업 중 미끄러져 추락



재해상황 >>

- 2018년 5월, OO부두에서 코일 양하작업을 위해 코일 2단(높이 약 2m)에서 라싱* 해체 작업 중 *선체 흔들림으로 인한 컨테이너, 화물 등의 낙하를 방지하기 위한 화물고정 작업
- 발이 미끄러져 뛰어내렸는데, 바닥에 놓여진 하역도구를 밟지 않기 위해 불안하게 착지를 하며 추락

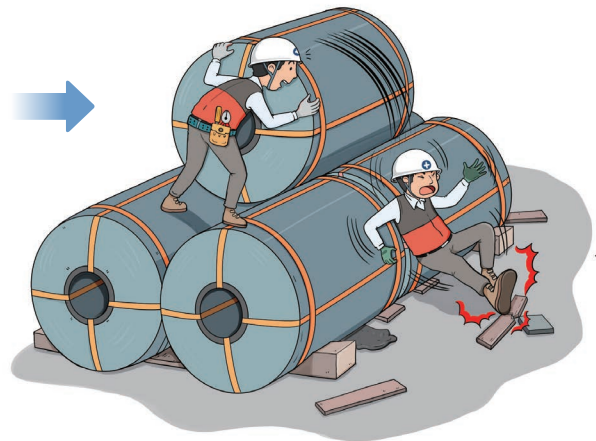

발생원인 >>

- 불안정한 작업환경(높은 고도 등)에서 안전조치가 미비한 상태로 작업
- 작업현장에 하역도구(고임목, 턴버클, 밴딩 등) 정리정돈 미비



예방대책 >>

- 대책 1** 코일 최상단 작업 가급적 자제 및 추락주의 경고표지 설치
- 대책 2** 하역도구는 작업에 지장이 없도록 지정된 장소에 정리정돈
- 대책 3** 협소한 공간에서는 최대한 안전한 작업이 이루어질 수 있는 위치를 선정하여 작업

